

**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN
SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN**

NOTA DINAS

NOMOR 530/DJPSDKP.2/TU.140/VII/2026

Yth : Direktur Jenderal PSDKP
Dari : Direktur Prasarana dan Sarana Pengawasan
Lampiran : Satu Berkas
Hal : Penyampaian Kinerja Direktorat Prasarana dan Sarana
Pengawasan Bulan Juni 2026
Tanggal : 03 Juli 2026

Sehubungan dengan kegiatan dan anggaran Direktorat Prasarana dan Sarana Pengawasan Tahun 2026, bersama ini terlampir kami sampaikan Kinerja Direktorat Prasarana dan Sarana Pengawasan Bulan Juni 2026.

Demikian disampaikan, atas petunjuk dan arahan lebih lanjut dari Bapak Direktur Jenderal kami ucapkan terima kasih.



**Ditandatangani
Secara Elektronik**

Sunaryo

Tembusan:

1. Sekretaris Ditjen PSDKP
2. Direktur lingkup Ditjen PSDKP



KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN
PERIKANAN

OCEAN
IMPACT
SUMMIT

KKP
2023

EKONOMI BIRU UNTUK
INDONESIA EMAS

LAPORAN KINERJA

Juni 2026



DIREKTORAT PRASARANA DAN
SARANA PENGAWASAN

#PSPSIGAP

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah
diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan • Berakuntabel • Kompeten
Harmonis • Loyal • Adaptif • Kolaboratif



Realisasi Anggaran

Periode Juni 2026



Pagu Efektif

Rp1.112.159.700.000

100%

Realisasi Anggaran

SP2D

Rp790.809.893

0,04%

Sisa Anggaran


Rp1.111.639.897.363

99,96%

PENGANGGARAN DIT PSP




Realisasi Anggaran (%)

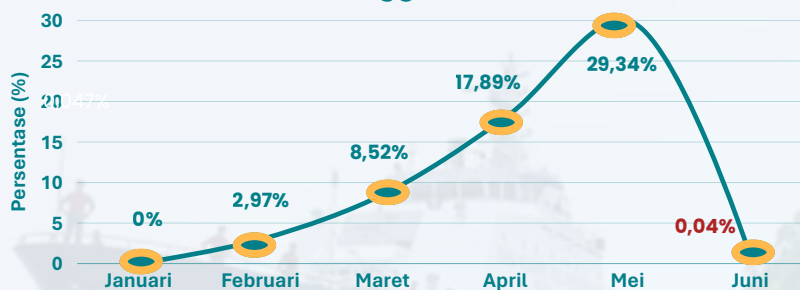

Realisasi anggaran pada bulan Juni 2026 mengalami penurunan menjadi 0,04% dari 29,34% di bulan Mei 2026 disebabkan penambahan anggaran MFISS sebesar Rp.1,110 Triliun

Realisasi Anggaran (Rupiah)

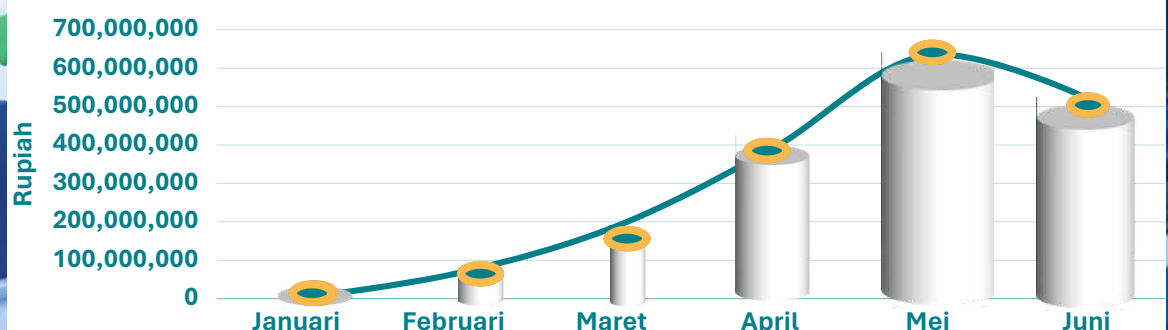

#PSPSICAR

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

Maritime and Fisheries Integrated Surveillance System (MFISS)

Koordinasi Percepatan Pembangunan Kapal Pengawas 70 Meter



Progres Konstruksi



Proses konstruksi pembangunan kapal pertama pada tahap penempatan blok 004 di *Slipway* dan blok lain ditargetkan selesai pada Juli 2026. Kapal kedua menyusul dengan blok 117 naik *Slipway* minggu ke dua Juli 2026. Instalasi listrik dimulai pada tanggal 6 Juli 2026

Desain Kapal



Seluruh gambar struktur baja telah disetujui LR. Namun, gambar pipa serta pemadam kebakaran (*fire and safety*) masih terkendala kejelasan tanggung jawab antara otoritas bendera (*flag authority*) dan LR. Gambar struktur telah disetujui, namun gambar pipa dan safety menunggu kejelasan wewenang antara LR dan otoritas bendera

Maritime and Fisheries Integrated Surveillance System (MFISS)

Koordinasi Percepatan Pembangunan Kapal Pengawas 70 Meter



Koordinasi Kegiatan MFISS terkait Aspek *Flag State* dan *Statutory*



Koordinasi dengan Direktorat Perkapalan dan Kepelautan, Kementerian Perhubungan pada tanggal 17 Juni 2026 untuk memastikan regulasi dalam pengiriman kapal pengawas dari Spanyol yang di rencanakan pada bulan Juni - Juli 2027 (2 unit) dan Januari 2028 (2 unit)

Dua Skema yang dapat digunakan dalam penentuan bendera kapal:

- Penggantian bendera dari Spanyol ke Indonesia setelah kapal tiba di Indonesia, lebih sederhana secara operasional dan efisien dari sisi biaya, namun mengakibatkan kapal berstatus sebagai kapal bekas;
- Penggunaan Bendera Indonesia sejak keberangkatan dari Spanyol yang merupakan skema preferensi KKP karena kapal langsung bersertifikat Indonesia, namun demikian skema ini memerlukan penugasan inspektur dan ahli ukur dari Indonesia



#PSPSIGAP

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (PSN Badan Usaha) pada 2026 dan 2027

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten,
Harmonis, Loyal, Adaptif, Kolaboratif



Maritime and Fisheries Integrated Surveillance System (MFISS)

Koordinasi Percepatan Pembangunan Kapal Pengawas 60 Meter



Progres Konstruksi



- Material dijadwalkan tiba di galangan PT Bandar Abadi pada 21 Juli 2026;
- Urutan Pembangunan terdiri dari 4 blok utama (102, 101, 100, 103) dan 1 superstructure (blok 200) dimulai dengan blok 102;
- Analisis getaran torsional (*Torsional Vibration*) dan *Computational Fluid Dynamics* (CFD) masih dalam proses perhitungan oleh Korindo dan diperkirakan akan memerlukan waktu lebih lama

Desain Kapal



Status persetujuan desain oleh Lloyd's Register (LR) saat ini terdiri atas 2 dokumen telah disetujui, 16 dokumen sedang dalam proses reviu, dan 10 dokumen masih memerlukan revisi oleh CintranaVal. Seluruh dokumen ditargetkan memperoleh persetujuan pada bulan Juli 2026, sehingga pelaksanaan *steel cutting* dapat dimulai sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan

#PSPSIGAP

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (PSNBN) pada 2026 Santri Negeri

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten,
Harmonis, Loyal, Adaptif, Kolaboratif

Maritime and Fisheries Integrated Surveillance System (MFISS)

Supervisi pembangunan dermaga pengawasan Pangkalan PSDKP Batam



Syarat Administrasi



Proses Pengurusan Dokumen KKPR di BP Batam



Dokumen KKPR di bagi menjadi dua, yaitu:

- Wilayah perairan depan Dermaga Pangkalan PSDKP Batam, mempergunakan dokumen PKKPR yang diterbitkan KKP Tahun 2023
- Wilayah perairan seluas +/- 4.000 m² disamping Dermaga, pemanfaatan oleh PT Batam Nara, dalam proses verifikasi teknis dari Badan Pengusahaan Batam

Kewajaran Harga Pembangunan Dermaga KP



PT Dkonsindo Citra Mandiri (Konsultan Manajemen Kontruksi) telah menyampaikan surat pernyataan kesesuaian penawaran biaya Nomor: 001/DCM/SKPB/VI/2026, 4 Juni 2026 kepada PPK MFISS dan siap menerima sanksi apabila tidak sesuai dengan ketentuan peraturan konstruksi.

#PSPSIGAP

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (PSN Badan Usaha) dan Badan Usaha

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten,
Harmonis, Loyal, Adaptif, Kolaboratif



Maritime and Fisheries Integrated Surveillance System (MFISS)

Supervisi pembangunan dermaga pengawasan Pangkalan PSDKP Batam



Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak



PT FIT telah menyampaikan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) sebagai bentuk tanggungjawab terhadap seluruh pekerjaan dermaga dan komitmen tidak adanya tuntutan ke KKP pada tanggal 19 Juni 2026.

Surat Perintah Mulai Kerja



Atas dasar SPTJM dan dokumen PKKPRL, PPK MFISS menyampaikan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor: 961/KPA.1-PSDKP/VI/2026 tanggal 23 Juni 2026.

Persiapan Kontruksi



- Pemasangan listrik darat 105 KVa ke dermaga sementara dengan jarak +/- 600 m² telah selesai;
- Material tiang pancang dan alat kontruksi sudah berada di perairan Kepulauan Riau di atas ponton;
- Material kontruksi dermaga lainnya seperti besi tulangan, *clamp spoon pile*, support perancah kontruksi *pile cap*, *bollard* dan *fender* sudah tersedia.

#PSPSIGAP

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSN) Badan Usaha Milik Negara

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten,
Harmonis, Loyal, Adaptif, Kolaboratif

Rekondisi MV. Run Zeng 03

Pelaksanaan Reviu Perencanaan Rekondisi



Hasil



- Kick Off Meeting Reviu Perencanaan Rekondisi Kapal Hasil Tangkapan (MV. Run Zeng 03)
- Pembahasan *General Arrangement* (GA) Reviu Perencanaan Rekondisi Kapal Hasil Tangkapan (MV. Run Zeng 03)
- Pembahasan kebutuhan material rekondisi Kapal Hasil Tangkapan (MV. Run Zeng 03)

General Arrangement



Wellhouse dibuat lebih luas dengan tata letak yang proporsional

Penggunaan RIB berkapasitas 6-8 penumpang

Tempat wudhu menggunakan ruang amunisi

Ruang wudhu awal digunakan untuk perluasan lounge VIP

Nama kapal Paus 02

Penambahan panjang kapal semula 49,79 M menjadi 51,32 M dengan peruntukan penambahan *diving pad* sehingga masuk kapal pengawas kelas I


Penggunaan Railing di buritan untuk memudahkan Henrikan

Amunisi room agar dipindahkan ke lower deck dijauhkan dari dapur atau sumber panas

Lounge VIP agar ditempatkan meja makan utk kapasitas 6 orang, dengan satu pintu

Dudukan senjata metraliur 12,7 dipindahkan di depan Wheelhouse

KELAS I



#PSPSIGAP

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (PSN Badan Usaha) No. 2026 dan No. 2028

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten,
Harmonis, Loyal, Adaptif, Kolaboratif

Perencanaan Kebutuhan dan Pengendalian Pembangunan Prasarana dan Sarana Pengawasan

Pengembangan SIRIP (Sistem Informasi Rencana Induk dan Pelaksanaan) PSP



Proses Awal



Pengembangan awal sistem SIRIP PSP meliputi penyusunan proses bisnis, *workflow*, desain sistem, dan integrasi data PSP

Koordinasi Pengembangan Infrastruktur dan Kerja Sama JICA



- Pendampingan tim JICA ke Sofifi (Survey lokasi ke 7)
- Menerima penyampaian laporan sementara hasil survey 7 lokasi, dan menerima hasil penetapan 2 kandidat (Natuna dan Sofifi) sebagai lokasi pengembangan prasarana dan sarana UPT
- Menjadwalkan pelatihan pegawai dan rencana uji coba satelit SAR pada Oktober 2026.



#PSPSIGAP

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (PSN Badan Usaha) pada 2026 Santri Negeri 8

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten,
Harmonis, Loyal & Adaptif & Inovatif

Supervisi, Penyediaan dan Kesiapan Prasarana Pengawasan

Supervisi dan Perencanaan Pembangunan Kantor



Supervisi Pembangunan Kantor Lanjutan Satwas PSDKP Padang



Progres pembangunan lanjutan Kantor Satwas SDKP Padang sebesar 11,74% berupa pekerjaan acian dinding lantai 2, plesteran dinding lantai 1, *afwerking* beton *expose* kolom lantai 1 dan rangka plafond

Supervisi Penyediaan Kantor Satwas PSDKP Tegal



Renovasi kantor Satwas SDKP Tegal, saat ini sedang tahap finalisasi RAB dan gambar perencanaan.

Supervisi Penyediaan Prasarana Kantor Pangkalan PSDKP Benoa



Renovasi kantor Satwas SDKP Benoa, pembuatan RAB dan gambar perencanaan telah selesai.

Supervisi, Penyediaan dan Kesiapan Prasarana Pengawasan

Supervisi Kesiapan Prasarana UPT Semester I TA 2026



Nilai kesiapan prasarana UPT PSDKP sampai dengan semester I TA 2026 untuk 7 (tujuh) UPT yaitu Jakarta, Tual, Lampulo, Batam, Kupang, Biak dan Tahuna sebesar 81 (indeks) dengan kategori siap

Hibah dan Pemanfaatan Lahan

Hibah lahan Satwas SDKP Kotabaru



Proses hibah lahan Satwas SDKP Kotabaru seluas 5.887 m²

- Penghapusan Hak Pemkab Kotabaru telah selesai
- Pendaftaran dan penerbitan sertifikat an. Pemerintah RI c.q KKP

Hibah lahan Satwas PSDKP Tumumpa



Progres hibah lahan dan bangunan Pelabuhan Perikanan Tumumpa, seluas 247,5 m²

- penyampaian surat permohonan hibah tanah dan bangunan ke Gubernur Sulawesi Utara
- penyampaian permohonan surat menerima hibah ke Biro Keuangan



#PSPSIGAP

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Nasional Sertifikasi Elektronik

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

Penguatan Kebijakan dan Supervisi Pembinaan Pokmaswas

Supervisi Pembinaan Pokmaswas dan Perubahan Kepmen KP No.58 Tahun 2001



Pembinaan Pokmaswas



- Sosialisasi dan Pembinaan Peningkatan Kapasitas Pokmaswas Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumbar dan Pokmaswas Kabupaten Muko-Muko Provinsi Bengkulu tanggal 17-18 Juni 2026
- Sosialisasi dan Pembinaan Pokmaswas di Pangkalan PSDKP Batam tanggal 18 Juni 2026
- Sosialisasi dan Pembinaan Pokmaswas Laut Selat Malaka berupa Sosialisasi Pengawasan SDKP tanggal 25 Juni 2026

Perubahan Kepmen KP No.58 Tahun 2001



- Finalisasi rancangan perubahan Kepmen KP No. 58 tahun 2001
- Finalisasi E-book Perdirjen No 5 Tahun 2021 & Kepdirjen No. 33 Tahun 2024

Capaian Kinerja Direktorat Prasarana dan Sarana Pengawasan

Capaian IP ASN, Capaian Penilaian SAKIP dan Capaian Verifikasi Arsip



1



CAPAIAN IP ASN
DIREKTORAT PRASARANA
DAN SARANA PENGAWASAN

NILAI IP ASN

85,05

KATEGORI TINGGI

2



**CAPAIAN PENILAIAN
MANDIRI SAKIP**
LINGKUP DITJEN PSDKP
TAHUN 2026

DIREKTORAT PSP
MENDAPAT NILAI

88,5

/ A

3



**CAPAIAN PENILAIAN
VERIFIKASI ARSIP**
DIREKTORAT PSP

MENDAPAT NILAI

91,75

/ AA

#PSPSIGAP

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSN) pada tahun 2026 dan berlaku.

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten,
Harmonis, Loyal, Adaptif, Kolaboratif



DIREKTORAT PRASARANA DAN SARANA PENGAWASAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif
